



Príloha č.2: Realizačný harmonogram stavebných prác s vyznačenou kritickou cestou



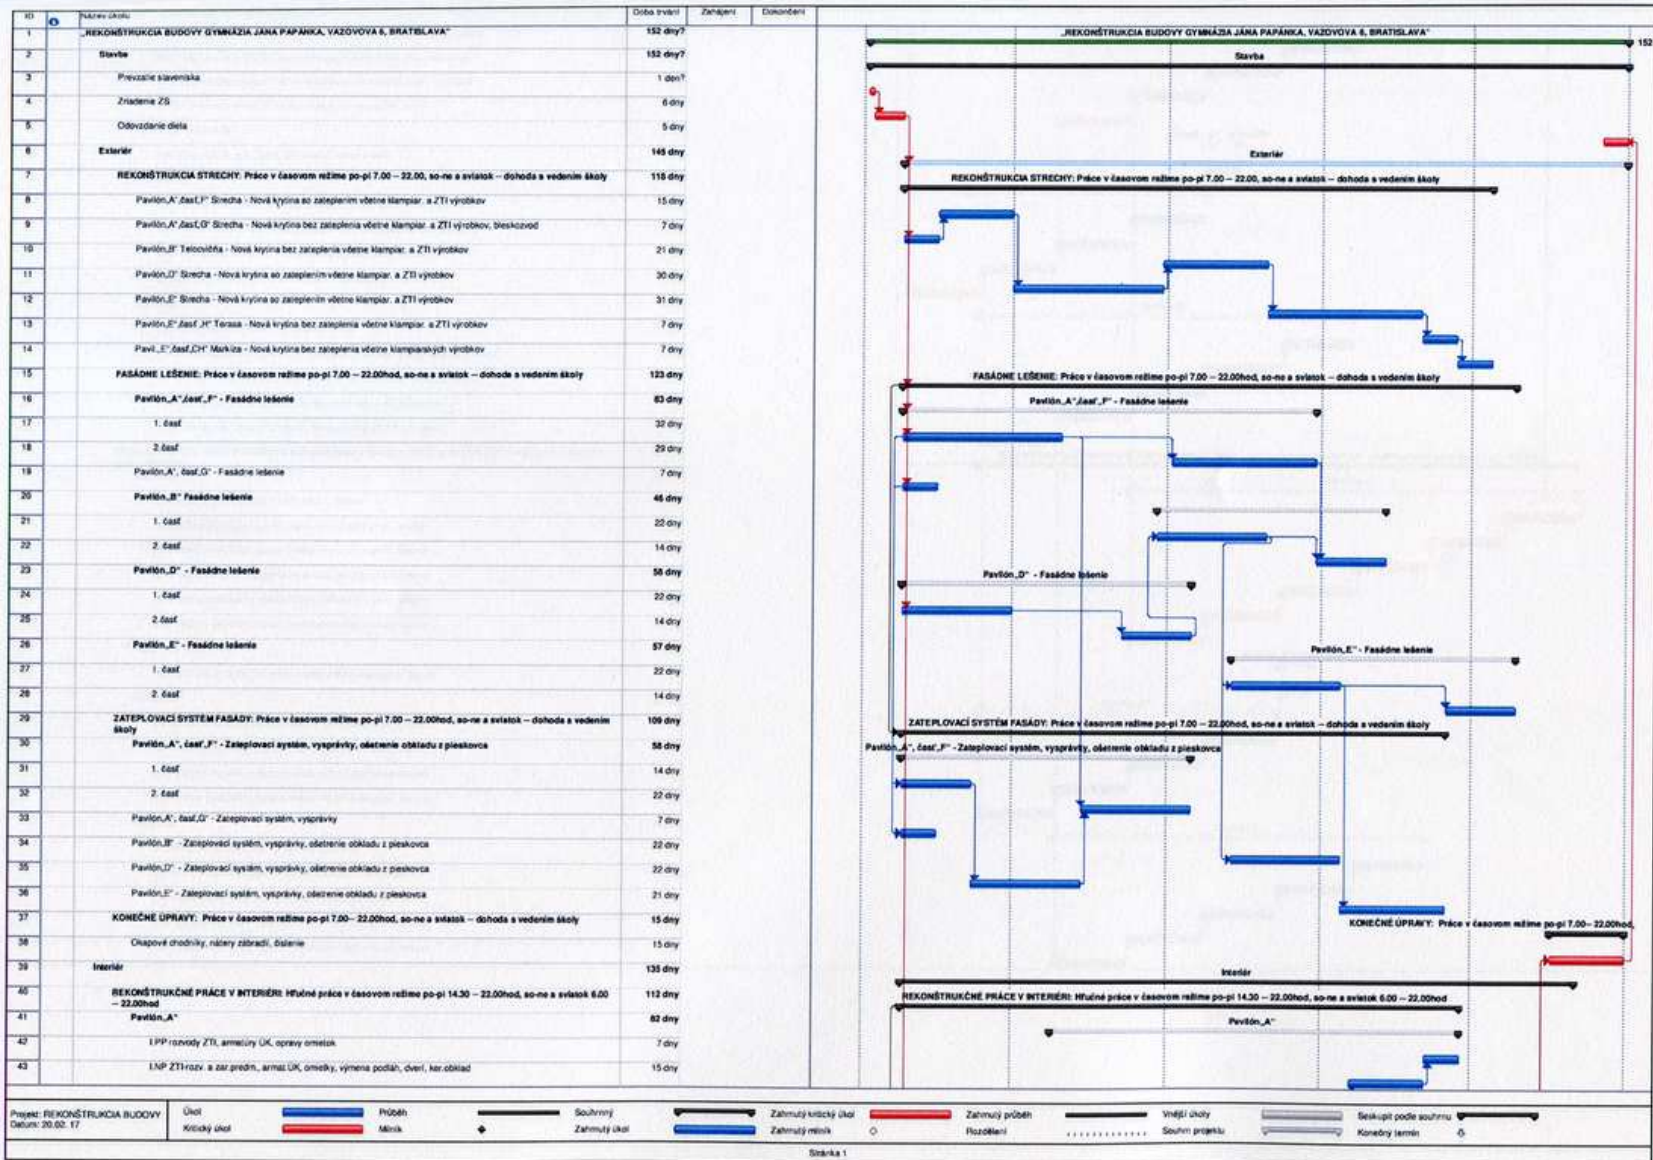

01	Název úkolu	Číslo tváří	Zahájení	Dokončení
44	II NP ZTI rozv. a zar.předn., armat.ÚK, omietky, výměna podlah, dveří, ker.obklad	15 dní		
45	III NP ZTI rozvody, armat.ÚK, opravy omietok, výměna podlah, dveří, ker.obklad	15 dní		
46	IV NP ZTI rozvody, armat.ÚK, opravy omietok, výměna podlah, dveří, ker.obklad	15 dní		
47	V NP ZTI rozvody, armat.ÚK, opravy omietok, výměna podlah, dveří	15 dní		
48	Pavilón „B“ Telocvišňa	7 dní		
49	I NP ZTI m.č.01.32 rozv., armat.ÚK, omietky, výměna dveří	7 dní		
50	Pavilón „D“	60 dní		
51	I NP ZTI rozv. a zar.předn., armat.ÚK, omietky, výměna podlah, dveří, ker.obklad	15 dní		
52	II NP ZTI rozv. a zar.předn., armat.ÚK, omietky, výměna podlah, dveří, ker.obklad	15 dní		
53	III NP ZTI rozvody, armat.ÚK, omietky, výměna podlah, dveří, ker.obklad	15 dní		
54	IV NP ZTI rozvody, armat.ÚK, omietky, výměna podlah, dveří, ker.obklad	15 dní		
55	Pavilón „E“	75 dní		
56	I a II NP rozvody ZTI armatúry ÚK, opravy omietok	15 dní		
57	I NP ZTI rozv. a zar.předn., rozv.přijmu, arm.ÚK, omietky, vým.podlah, dveří, ker.obklad	15 dní		
58	II NP ZTI rozv. a zar.předn., armat.ÚK, omietky, výměna podlah, dveří, ker.obklad	15 dní		
59	III NP ZTI rozvody, armat.ÚK, omietky, výměna podlah, dveří, ker.obklad	15 dní		
60	IV NP ZTI rozvody, armat.ÚK, omietky, výměna podlah, dveří, ker.obklad	15 dní		
61	REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE V INTERIERI. Neúfolné práce v časovom režime po-ri 7.00 – 22.00hod, so-ne a sviatok 6.00 – 22.00hod	120 dní		
62	Pavilón „A“	80 dní		
63	I PP maľby a olej.nátery, dokončujúce práce, štukovanie	15 dní		
64	I NP maľby a olej.nátery, lepenie linolea, dokončujúce práce, štukovanie	15 dní		
65	II NP maľby a olej.nátery, lepenie linolea, dokončujúce práce, štukovanie	15 dní		
66	III NP maľby a olej.nátery, lepenie linolea, dokončujúce práce, štukovanie	15 dní		
67	IV NP maľby a olej.nátery, lepenie linolea, dokončujúce práce, štukovanie	15 dní		
68	V NP maľby a olej.nátery, lepenie linolea, dokončujúce práce, štukovanie	15 dní		
69	Pavilón „B“ Telocvišňa	7 dní		
70	I NP m.č.01.29,01.30,01.33 omietky+maľby, dokončujúce práce, štukovanie	7 dní		
71	Pavilón „D“	60 dní		
72	I NP maľby a olej.nátery, lepenie linolea, dokončujúce práce, štukovanie	15 dní		
73	II NP maľby a olej.nátery, lepenie linolea, dokončujúce práce, štukovanie	15 dní		
74	III NP maľby a olej.nátery, lepenie linolea, dokončujúce práce, štukovanie	15 dní		
75	IV NP maľby a olej.nátery, lepenie linolea, dokončujúce práce, štukovanie	15 dní		
76	Pavilón „E“	75 dní		
77	I PP maľby a olej.nátery, dokončujúce práce, štukovanie	15 dní		
78	I NP maľby a olej.nátery, lepenie linolea, dokončujúce práce, štukovanie	15 dní		
79	II NP maľby a olej.nátery, lepenie linolea, dokončujúce práce, štukovanie	15 dní		
80	III NP maľby a olej.nátery, lepenie linolea, dokončujúce práce, štukovanie	15 dní		
81	IV NP maľby a olej.nátery, lepenie linolea, dokončujúce práce, štukovanie	15 dní		

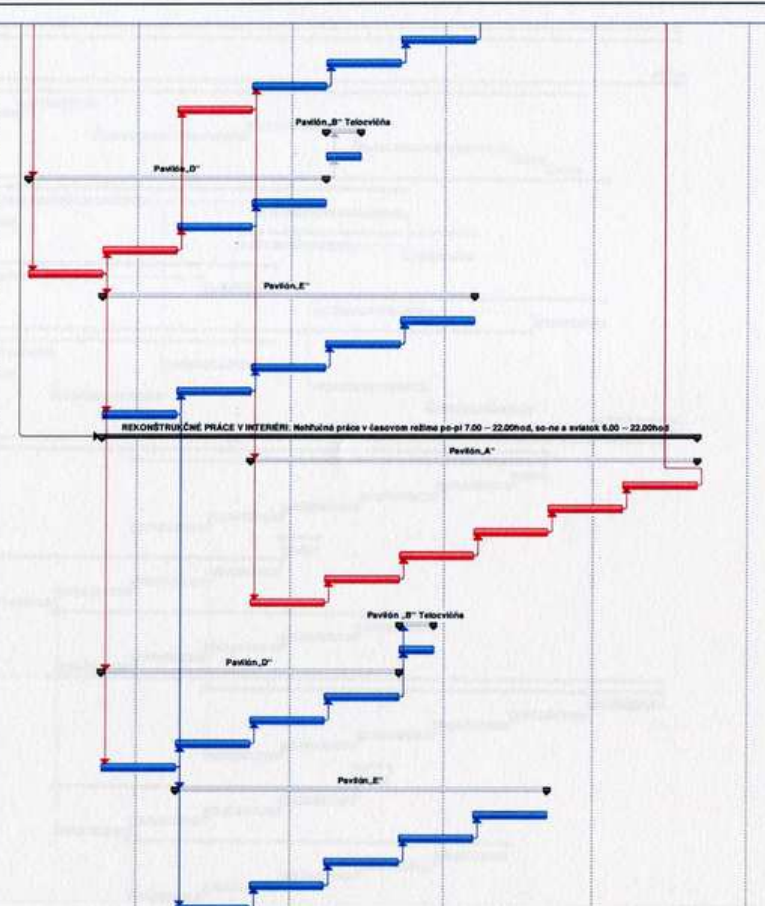

Projekt: REKONŠTRUKCIA BUDOVY
 Datum: 20.02.17

Úkol	Průběh	Seznamný	Zahmutý klíčový úkol	Zahmutý průběh	Vnější úkoly	Seznam podlé souhrnu
Klíčový úkol	Mínus	Zahmutý úkol	Zahmutý mínus	Rozložení	Seznam projektu	Konečný termín

Stránka 2

